


Installation of S-band Receiving Station

Graduate Institute of Space Science and Engineering
Center for Astronautical Physics and Engineering

S-band receiving station

- 11/7 (THU) - 11/8 (FRI): 健雄館屋頂隔熱磚移除（僅限於接收站基座螺孔處）。
- 11/11 (MON) - 11/12 (TUE): 接收站、基座、小型吊車、堆高機等吊掛作業（健雄館前與沿途停車位須淨空，以便大型吊車進駐與撤離）。
- 11/13 (WED) - 11/15 (FRI): BCTech 於健雄館屋頂安裝接收站基座。
- 11/18 (MON) - 11/22 (FRI): ComTech 於健雄館屋頂安裝接收站。
- 11/25 (MON) - 11/26 (TUE): 小型吊車、堆高機等吊掛作業（健雄館前與沿途停車位須淨空，以便大型吊車進駐與撤離）。

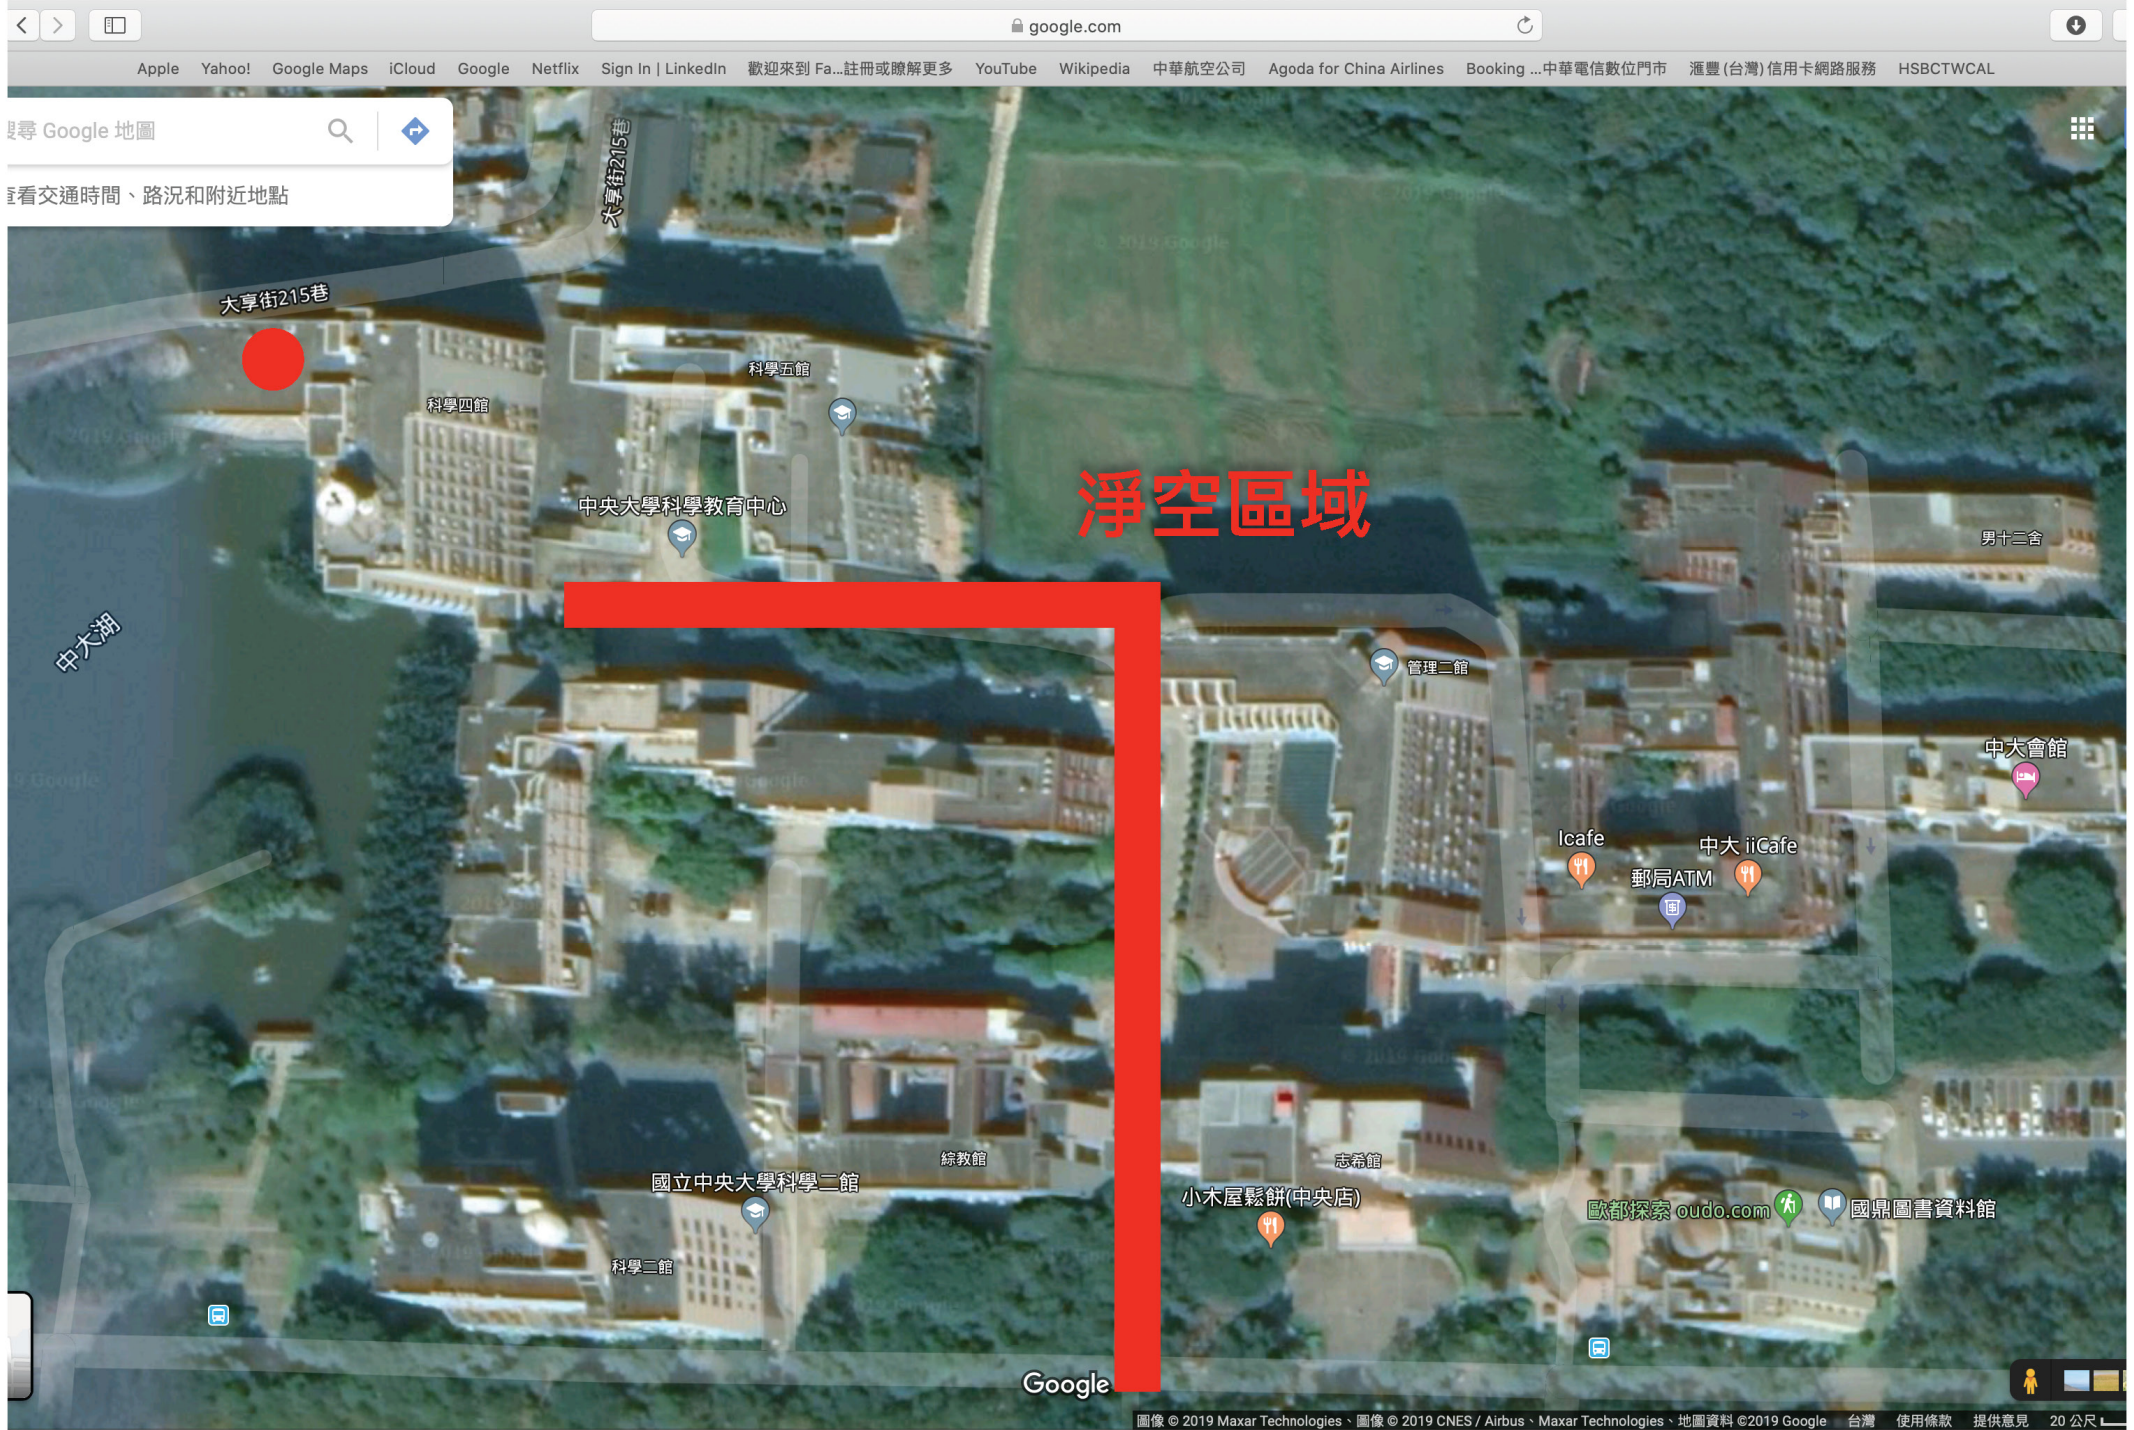

搜尋 Google 地圖

查看交通時間、路況和附近地點

淨空區域



吊車位置
